Documento de Finalización - Sprint 1

Proyecto: Sistema de Gestión de Expedientes Clínicos

Fecha: 03 de Marzo, 2026

Sprint Review

Objetivo: Evaluar el incremento de software entregado frente al Sprint Backlog.

Resumen de Entregables

- **Historias de Usuario (HU) comprometidas:** 8
- **HU Completadas:** 3 completas + 1 "sobre el tiempo" (Total: 4)
- **HU Pendientes:** 4 (Se mueven al Backlog para re-priorizar en el Sprint Planning 2).

Detalle de lo completado:

1. **HU-01 – Inicio de sesión (Talla L):** Implementado con autenticación. *Observación docente: Mejorar manejo de roles desde BD.*
2. **HU-02 – Cierre de sesión (Talla S):** Funcional al 100%.
3. **HU-03 – Visualización de menú por rol (M):** Menú dinámico funcional. *Observación docente: Configurar dashboards y forms específicos por componente con acceso por rol desde la BD.*
4. **HU-04 – Crear expediente (M):** Finalizada el sábado. Avance funcional.

Feedback Técnico (Observaciones del Ingeniero):

- Unificar columnas de tablero (QA/Testing -> una sola).

- Configurar Pruebas Unitarias con GitHub Actions para automatizar el deploy.
- Documentar cada cierre de Sprint y vincularlo al tablero.

Sprint Retrospective

Objetivo: Evaluar la velocidad y el funcionamiento interno del equipo.

Análisis de Velocidad (Tallas de Camiseta)

Para este cierre de Sprint, hemos evaluado el desempeño del equipo utilizando el sistema de Tallas de Camiseta y su conversión a puntos de historia (basados en la secuencia de Fibonacci adaptada).

***Se optó por este enfoque debido a que la moda resultó insuficiente para representar la capacidad real, dado que contábamos con una distribución uniforme de tallas (una de cada tipo) hasta la integración de la última funcionalidad Talla M entregada sobre el tiempo de cierre.*

Historia de Usuario (HU)	Talla de Camiseta	Puntos Asignados	Estado
HU-01: Inicio de sesión	**L**	5	Finalizada
HU-03: Visualización de menú por rol	**M**	3	Finalizada

HU-04: Crear expediente	**M**	3	Finalizada (Sábado)
HU-02: Cierre de sesión	**S**	1	Finalizada

Cálculo de Velocidad:

- **Velocidad Total (Sumatoria): 12 Puntos.** Este es nuestro techo para el inicio del Sprint 2.

  *** No deberíamos comprometernos a más de 12-14 puntos para evitar sobrecarga.*

- **Moda de Complejidad: Talla M (Frecuencia: 2).** * *Interpretación:* La capacidad dominante del equipo actualmente es resolver tareas de **Complejidad Media**. Aún nos toma un esfuerzo extraordinario (Milla Extra) sacar tareas Talla L.

Inspección del Proceso (Dinámica del Equipo)

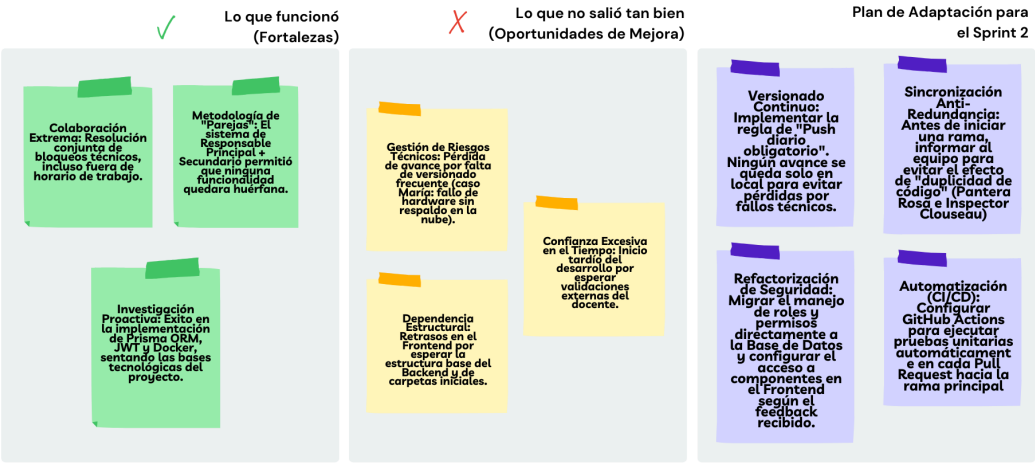

Retrospectiva del equipo

Ver diseño completo aquí

Presentado por Grupo Kaizen

Metas del próximo Sprint:

Mantener nuestra velocidad de 12-13 puntos, priorizando la estabilidad del Backend y la configuración de accesos por rol desde la base de datos.

Documentación de eventos del Scrum
